



## RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.  
 Secretário  
 NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 12ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 7.506.304,56 (sete milhões, quinhentos e seis mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 12ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 1.496.399,98 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).  
 Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	7.267.564,96
Total dos Reajustamentos -----	R\$	238.739,60
Valor Global Atual -----	R\$	7.506.304,56
Valor Global Anterior ( - ) -----	R\$	6.009.904,58
Saldo desta a pagar -----	R\$	1.496.399,98

Palmas - TO, 14 de outubro de 2025

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Visto:

Aprovo:

Antonio Trabulsi Sobrinho  
 Presidente - Interviente

Amélio Cayres de Almeida  
 Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 16/10/2025 14:04:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 15/10/2025 10:48:10

ide Tec

EXISTEM MAIS 3 SIGNATARIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A327FA022B72D9 | SGD:2025/38989/056293





## REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodeaprovação.pdf do documento 2025/38969/056293 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	16/10/2025 14:04:19 Assinado por LOGIN E SENHA por: Antonio Trabulsi Sobrinho
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	15/10/2025 10:48:10 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	15/10/2025 09:30:28 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	15/10/2025 08:41:53 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	15/10/2025 08:40:54 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins  
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura  
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00  
 Relatório de Medições de Obra

### MEDIÇÃO DA 12ª PARCELA

**Contrato:** 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 0062830962024  
**Depto Executor:** 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024  
**SubContrato:** 0 **Data da Parcela:** 14/10/2025 **Período de Avaliação:** 01/09/2025 a 30/09/2025  
**Nº da Parcela:** 012 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

**Local:** PALMAS **Rodovia:**  
**Objeto:** 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01.01.000	PROJETOS								
01.02.000	LICENCIAMENTO								
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL		7.68925	0.00000	7.68925	7.205.81510	55.407.31376	0.00000	55.407.31376
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	6.45491	0.00000	6.45491	910.20820	5.875.31201	0.00000	5.875.31201
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	29.15261	0.00000	29.15261	35.991.15030	1.049.235.96815	0.00000	1.049.235.96815
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	3.37065	0.00000	3.37065	10.239.64260	34.511.92546	0.00000	34.511.92546
01.03.007	ALVENARIAS	%					1.145.033.51938	0.00000	1.145.033.51938
	SubTotal Sub Item.....						1.145.033.51938	0.00000	1.145.033.51938
	SubTotal Item.....						1.145.033.51938	0.00000	1.145.033.51938
	Total Parcial.....						1.145.033.51938	0.00000	1.145.033.51938
	Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência						0.00000	0.00000	0.00000
	Total Parcela.....						1.145.033.51938	0.00000	1.145.033.51938

AGETO  
 Fis 1282  
 Bb

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 15/10/2025 10:48:10  
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 14/10/2025 14:39:04  
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PAGINA DE ASSINATURA  
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 0AB34B4A022B7347 | S/GD-2025-38969/056284





### MEDIÇÃO DA 12ª PARCELA

**Contrato:** 000222024      **Contratada:** 04490079000137      **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**  
**Depto Executor:** 1      **Data da SubContratação:** 0132038962023      **Processo Medição:** 0062830962024  
**SubContrato:** 0      **Data da Parcela:** 14/10/2025      **Período de Avaliação:** 01/09/2025 a 30/09/2025  
**Nº da Parcela:** 012      **Nº da O.S.:** 000220012024      **Data da O.S.:** 24/06/2024      **Data Assin.:** 28/05/2024

**Local:** PALMAS      **Rodovia:**  
**Objeto:** 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	PLANILHA APROVADA	%	100,00000	0,00000	100,00000	5,856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO	%	24,50000	8,10000	32,60000	9,082,94830	222.532,23335	73.571,88123	296.104.11458
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3,223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,53250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3,675,77830	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	57,37310	0,00000	57,37310	24,614,41130	1.412,205,08096	0,00000	1.412,205,08096
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	40,46463	0,00000	40,46463	9,599,30560	388.432,34936	0,00000	388.432,34936
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	80,02583	53,62745	133,65328	5,892,16562	780.181,06428	321.344,56216	1.101.525,62645
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	26,39848	26,39848	52,79696	2,388,19890	125.118,81110	63.482,73375	188.601,54485
01.01.008	COBERTURA	%	8,89862	26,58183	35,48045	42,189,19080	1.500,00000	906.804,34165	1.545.241,93212
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	15,22754	21,49376	36,72130	42,189,19080	1.500,00000	6.343,98961	6.343,98961
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	0,00000	0,86169	0,86169	7,362,26440	0,00000	6.343,98961	6.343,98961
01.01.013	PINTURA	%	23,80482	4,88684	28,69166	1,090,53370	25.959,95843	5.329,26371	31.289,22214
01.01.018	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	5,86450	5,54769	11,41219	21,544,68250	126.348,79052	119.523,21966	245.872,01018
01.01.024	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	50,00000	0,00000	50,00000	6,005,07440	300.253,72000	0,00000	300.253,72000
01.01.025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	50,00000	0,00000	50,00000	6,005,07440	300.253,72000	0,00000	300.253,72000
SubTotal Sub item.....							4.626.131,50752	1.496.399,98178	6.122.531,48930
SubTotal Item.....							4.626.131,50752	1.496.399,98178	6.122.531,48930





Governo do Estado do Tocantins  
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura  
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00  
 Relatório de Medições de Obra

**MEDIÇÃO DA 12ª PARCELA**

**Contrato:** 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 0062830962024  
**Depto Executor:** 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024  
**SubContrato:** 0 **Data da Parcela:** 14/10/2025 **Período de Avaliação:** 01/09/2025 a 30/09/2025  
**Nº da Parcela:** 012 **Nº da O.S.:** 000220022024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Total Parcial.....	4.626.131,50752	1.496.399,98178	5.122.531,48930
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência	0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....	4.626.131,50752	1.496.399,98178	5.122.531,48930
Total das Parcelas.....	5.771.165,02689	1.496.399,98178	7.267.565,00867

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 1.496.399,98 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e trezentos e noventa e nove reais e nove e oito centavos)  
 Palmas-TO, 14 de outubro de 2025.

AGETO  
 Fis 1284  
 Bch

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 15/10/2025 10:48:10  
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 14/10/2025 14:39:04  
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATARIOS NA PAGINA DE ASSINATURA  
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 0A834E6A022B7347 | SGO-2025/38969/056294





### REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/056294** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	15/10/2025 10:48:10 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	14/10/2025 14:39:04 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	14/10/2025 14:08:22 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	14/10/2025 13:58:24 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



**Processo Medição** 00628/3096/2024  
**Data da Assinatura:** 28/05/2024  
**Valor Contrato:** 18.786.000,00  
**Valor dos Aditivos:** 0,00  
**Valor Total Contrato:** 18.786.000,00  
**Prazo:** 549 Dias  
**Prorrogações Conced.:** 0 Dias

**Contrato:** 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA  
**Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local:** PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO  
**Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local:** PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			EXECUTADO		REAJUSTE		TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado			
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	51.593,39	51.593,39	51.593,39	658.274,71	3.622.125,37
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	37.143,74	88.737,13	88.737,13	473.913,11	4.056.038,48
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	60.560,23	149.297,36	149.297,36	772.681,70	4.868.720,18
10 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	30.543,65	179.841,01	179.841,01	369.703,35	5.258.423,53
11 a	01/08/2025 a 30/08/2025	692.582,46	3,68 %	5.771.164,98	30,72 %	58.898,59	238.739,60	238.739,60	751.481,05	6.009.904,58
12 a	01/09/2025 a 30/09/2025	1.496.399,98	7,96 %	7.267.564,96	38,68 %	127.256,84	365.996,44	365.996,44	1.623.656,82	7.633.561,40

Diretoria de Tecnologia da Informação | R/L Faturamento | ANDRE LUIZ COST | 14/10/2025 | Página : 1

Engº Fiscal Ageto/sop/dfmpop | Engº Civil Luiz Costa Lima | Engº Civil Fernanta de Silva O. Glória | Engº Civil Camylla Ferreira César | Engº Civil Candido F. Colino Jr  
 Gerente de Medição de Obras Públicas | Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas | Superintendente de Obras Públicas





## REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento 2025/38969/056294 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	15/10/2025 10:48:11 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	14/10/2025 14:39:04 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	14/10/2025 14:08:22 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	14/10/2025 13:58:24 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AGETO  
Fis 1288  
186

# FOTOGRAFICO RELATÓRIO

**CONTRATO:00022/2024**

**OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO**

**VISITA : 06/10/2025 REFERENTE À 12ª MEDIÇÃO**

**LOCAL : PALMAS**

**EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 14/10/2025 13:58:24


Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: EED23C94022B7349 | SGD:2025/38969/056294




=> Estrutura metálica p cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)

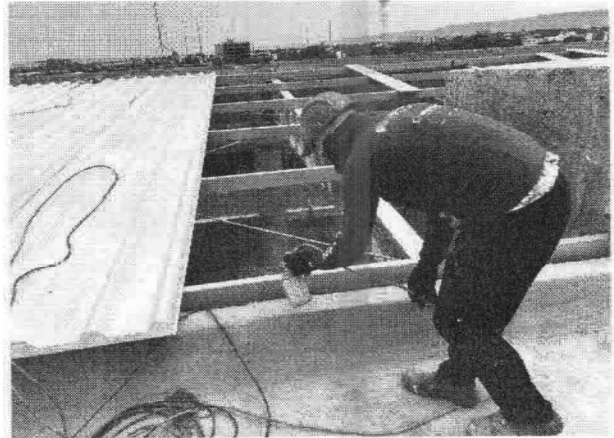

=> Estrutura metálica p cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)

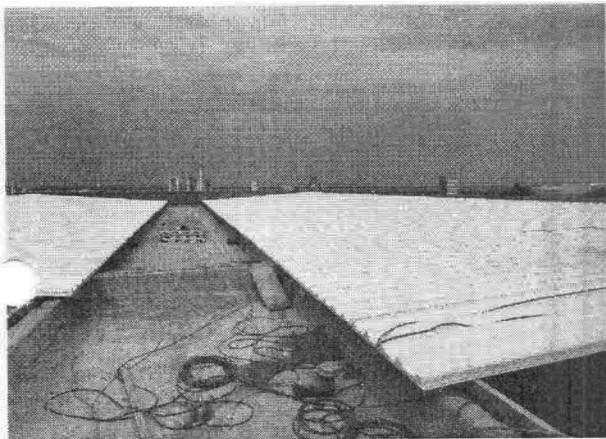

=> TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

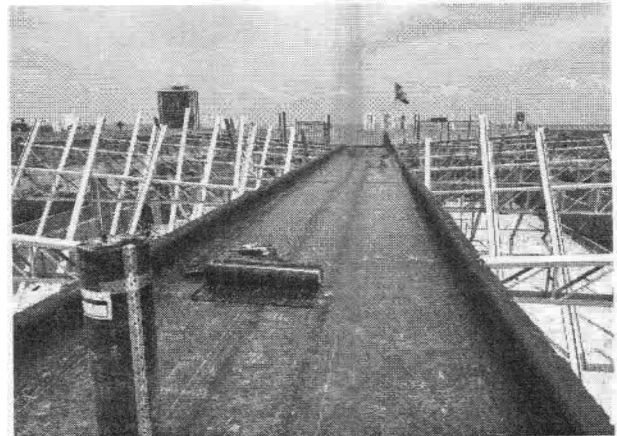

=> IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA







=> IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA



=> PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA

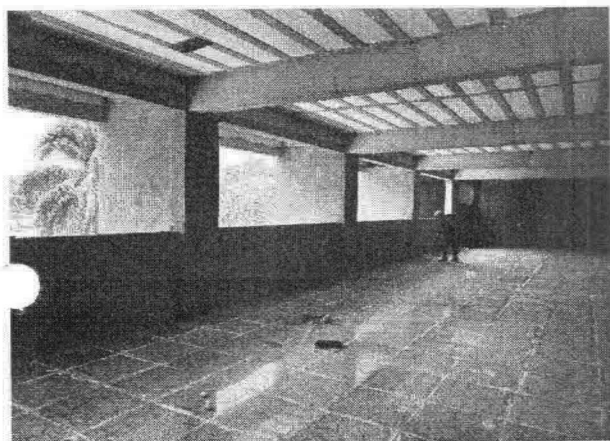


=> REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

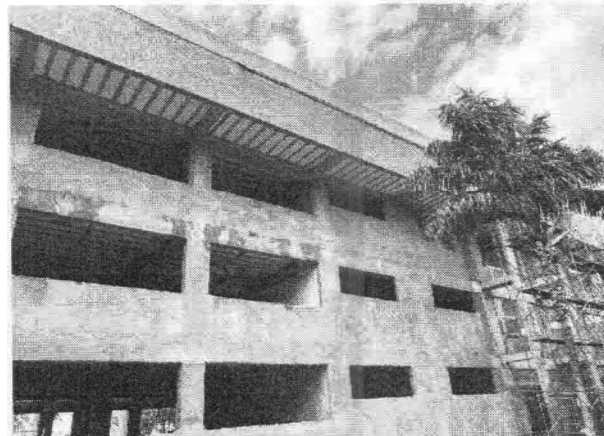

=> REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS




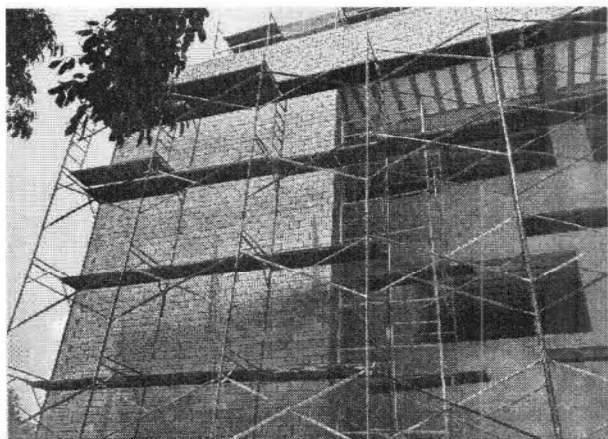


=> REVESTIMENTO COM LITOCERAMICA



=> CONTRAPISO EM ARGAMASSA

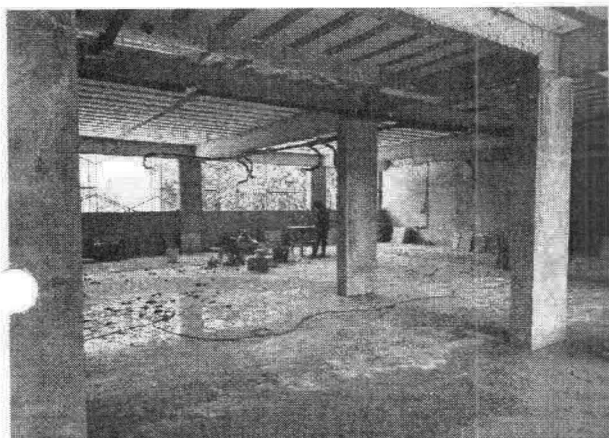


=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS

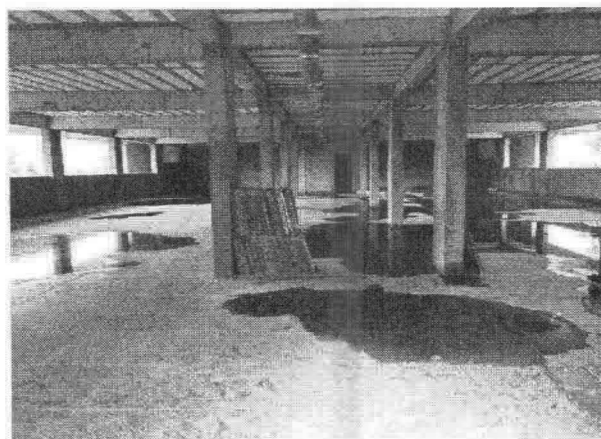



=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS



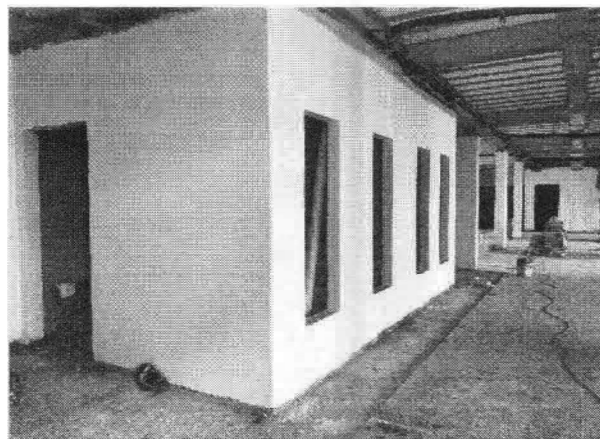

⇒ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL


⇒ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

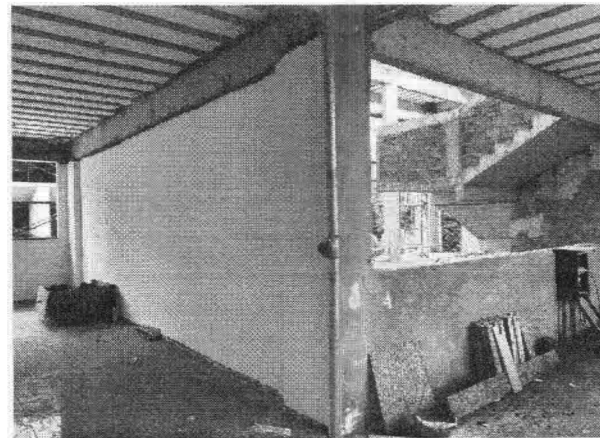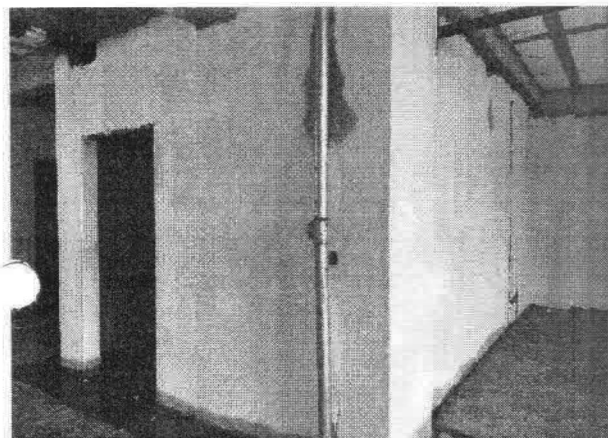


⇒ SISTEMA DE HIDRANTES

⇒ SISTEMA DE HIDRANTES



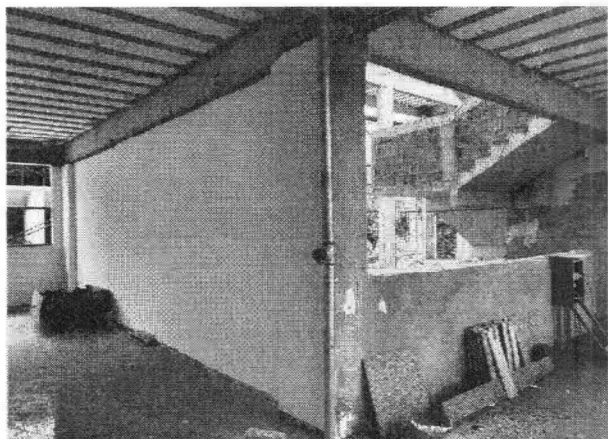


=> DUTO PARA EXAUSTAO/VENTILACAO

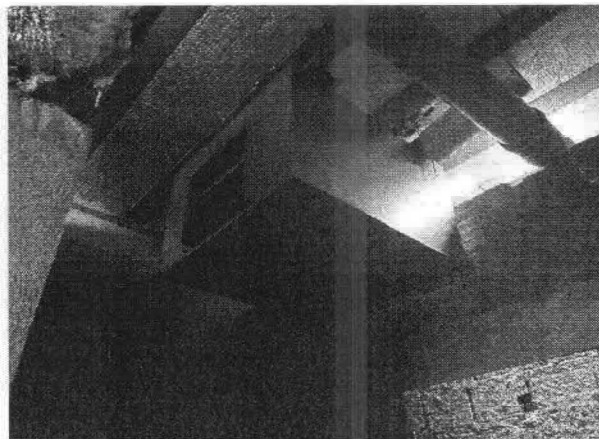

=> Caixa ventiladora com ventilador centrifugo



=> SISTEMA DE AR CONDICIONADO

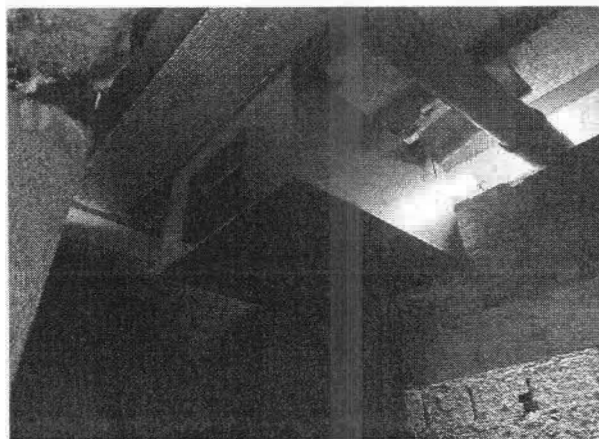

Caixa ventiladora com ventilador centrifugo





Governo do Estado do Tocantins  
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura  
**ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)**

AGETO  
Fls 1294  
B6

Contrato: 00022/2024 SubContrato: 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00  
Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA Data assinatura: 28/05/2024  
Data-Base: 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024  
Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL  
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s): PALMAS

**VALORES**

Valor Contrato a PI	: 18.786.000,00	
Aditivos	: 0,00	
Valor Total a PI	: 18.786.000,00	
Valor Medido a PI	: 7.267.564,96	38,69%
Valor Medido Reajustamento	: 365.996,44	
Valor Total Faturado	: 7.633.561,40	
Saldo do Contrato	: 11.518.435,04	61,31%
Última Medição	: 12ª - Parcial	
Período da Última Medição	: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Situação	: Em Andamento	

**PRAZO / ADITIVOS**

Data da Ordem de Serviço	: 24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	: 28/05/2024
Prazo Execução Contratual	: 549	Prazo de Vigência	: 731
Venc. do Prazo de Execução	: 24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	: 28/05/2026



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 14/10/2025 13:58:24

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B71D810B022B734A | SGD:2025/38969.056294



# MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900  
Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

AGETO  
Fls 1295  
-900  
136



Nota: 2025000

00000042

Código Verificação  
SNAN-PU34

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/10/2025 11:50:27

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

10/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**CONSTRUTORA ACAUA LTDA**

Nome Fantasia

**CONSTRUTORA ACAUA**

Email

**acaua@acaua.com.br**

CPF/CNPJ

**04.490.079/0001-37**

Inscrição Municipal

**187879**

Inscrição Estadual

**294001417**

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(63) 3216-1855**

Endereço

**Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**FADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

CPF/CNPJ

**25.053.125/0001-00**

Inscrição Municipal

**502146**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(63) 3212-5148**

E-mail

**cofin@al.to.leg.br**

Endereço

**Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.**

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 448.919,99

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 1.047.479,99

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 1.496.399,98

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	17.956,80	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.496.399,98	448.919,99	0,00	1.047.479,99	5,00
TSS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	52.374,00	0,00	1.426.069,18	1.496.399,98

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 201.265,80 Federal e R\$ 74.820,00 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 1721000120449067900013725000000004225100320555352

Visualizado em: 20/10/2025 11:50:28

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



**Contrato nº 22/2024**

PROCESSO: 2024/38960/000628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

**ATESTO**

ATESTO à nota fiscal nº 042/2025, no valor de R\$ 1.496.399,98 (Um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Referente à 12ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 20 de outubro de 2025.

*Assinado Digitalmente*  
**André Luiz Costa Lima**  
Matrícula: 11684976-4  
Fiscal de Obra.

