



## RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.  
 Secretário  
 NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 13ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 9.215.515,21 (nove milhões, duzentos e quinze mil e quinhentos e quinze reais e vinte e um centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 13ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 1.581.953,81 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).  
 Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições ----- R\$	8.849.518,77
Total dos Reajustamentos ----- R\$	365.996,44
Valor Global Atual ----- R\$	9.215.515,21
Valor Global Anterior ( - ) ----- R\$	7.633.561,40
 Saldo desta a pagar ----- R\$	 1.581.953,81

Palmas - TO, 12 de novembro de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

**Amélio Cayres**  
 Presidente

Antonio Trabulsi Sobrinho  
 Presidente - Interveniente

Amélio Cayres de Almeida  
 Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 18/11/2025 09:41:47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/11/2025 10:55:01

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 7525135702329B60 | SGD:2025/38969/061113





### REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatório de aprovação.pdf do documento 2025/38969/061113 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	18/11/2025 09:41:47 Assinado por LOGIN E SENHA por: Antonio Trabulsi Sobrinho
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/11/2025 10:55:01 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	13/11/2025 09:42:30 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	12/11/2025 11:48:56 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	12/11/2025 11:16:05 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



### MEDIÇÃO DA 13ª PARCELA

**Contrato:** 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**  
**Depto Executor:** 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024  
**SubContrato:** 0 **Data da Parcela:** 12/11/2025 **Período de Avaliação:** 01/10/2025 a 31/10/2025  
**Nº da Parcela:** 013 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

**Local:** PALMAS **Rodovia:**

**Objeto:** 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01.01.000	PROJETOS								
01.02.000	LICENCIAMENTO								
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	7,68925	0,00000	7,68925	7.205,81510	55.407,31376	0,00000	55.407,31376
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	6,45491	0,00000	6,45491	910,20820	5.875,31201	0,00000	5.875,31201
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	29,15261	0,00000	29,15261	35.991,15030	1.049,235,96815	0,00000	1.049,235,96815
01.03.007	ALVENARIAS	%	3,37065	0,00000	3,37065	10.239,84260	34.514,92546	0,00000	34.514,92546
	SubTotal Sub Item.....						1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938
	SubTotal Item.....						1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938
	Total Parcela.....						1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938
	Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência						0,00000	0,00000	0,00000
	Total Parcela.....						1.145.033,51938	0,00000	1.145.033,51938

AGETO  
 Fis 1325  
 BL

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/11/2025 10:55:01  
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 13/11/2025 09:42:31  
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA  
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: AQAAFB5A02329C1D | SGD:2025/38969/061117





**MEDIÇÃO DA 13ª PARCELA**

Contrato: 000222024      Contratada: 04490079000137      CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Depto Executor: 1      Data da SubContratação:      Processo: 0132038962023      Processo Medição: 0062830962024

SubContrato: 0      Data da Parcela: 12/11/2025      Período de Avaliação: 01/10/2025 a 31/10/2025

Nº da Parcela: 013      Nº da O.S.: 000220012024      Data da O.S.: 24/06/2024      Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS      Rodovia:

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant. Período	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Prego Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA	%	100,00000	0,00000	100,00000	5.856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO	%	32,60000	8,38000	40,98000	9.082,94830	296.104,11458	76.115,10875	372.219,22133
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,53250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.675,77630	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	57,37310	0,00000	57,37310	24.614,41130	1.412.205,08096	0,00000	1.412.205,08096
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	40,46463	0,00000	40,46463	9.599,30560	388.432,34936	0,00000	388.432,34936
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	80,02593	17,18466	97,21059	5.992,16562	479.528,62645	102,973,32884	582.501,95530
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	35,48045	27,33518	62,81563	2.388,19990	84.734,40714	65,281,87414	150.016,28128
01.01.008	COBERTURA	%	36,72130	15,81619	52,53749	42,189,19080	1.549,241,93212	667,272,25764	2.216.514,18976
01.01.009	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	0,86169	2,31994	3,18163	7.382,28440	6.343,98961	17,080,01167	23.424,00128
01.01.010	REVESTIMENTOS	%	0,00000	47,85673	47,85673	1.105,17080	0,00000	52.889,86058	52.889,86058
01.01.011	PINTURA	%	0,00000	13,16174	13,16174	749,52160	0,00000	9.865,00842	9.865,00842
01.01.012	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	0,00000	7,55654	7,55654	2.203,20660	0,00000	16.648,61880	16.648,61880
01.01.013	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	28,69166	0,00000	28,69166	1.090,53370	31.289,22214	0,00000	31.289,22214
01.01.014	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	%	11,41219	26,63431	38,04650	21.544,68250	245.872,01018	573,827,75256	819.699,76274
01.01.015	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	50,00000	0,00000	50,00000	6.005,07440	300.253,72000	0,00000	300.253,72000
01.01.016	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%							
01.01.017	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%							
SubTotal	Sub Item.....						6.122.531,48930	1.581.953,81941	7.704.485,30871

AGETO  
 Fls 1326  
 RB

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/11/2025 10:55:01  
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 13/11/2025 09:42:31  
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA  
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A0AAAFBSA02329C1D | SGD:2025/88969/061117





**MEDIÇÃO DA 13ª PARCELA**

**Contrato:** 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**  
**Depto Executor:** 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024  
**SubContrato:** 0 **Data da Parcela:** 12/11/2025 **Período de Avaliação:** 01/10/2025 a 31/10/2025  
**Nº da Parcela:** 013 **Nº da O.S.:** 000220022024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

SubTotal Item.....	6.122.531,48930	1.581.953,81941	7.704.485,30871
Total Parcial.....	6.122.531,48930	1.581.953,81941	7.704.485,30871
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência	0.00000	0.00000	0.00000
Total Parcela.....	6.122.531,48930	1.581.953,81941	7.704.485,30871
Total das Parcelas.....	7.267.565,00867	1.581.953,81941	9.849.518,92809

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 1.581.953,81 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) Palmas-TO, 12 de novembro de 2025.

AGETO  
 Fls 1327  
 B5

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/11/2025 10:55:01  
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 13/11/2025 09:42:31  
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATARIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA  
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: A0AAF85A02329C1D | SGD:2025/38969/061117





## REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/061117** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/11/2025 10:55:01 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	13/11/2025 09:42:31 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	12/11/2025 11:48:57 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	12/11/2025 11:16:05 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Contrato: 00022/2024 SubContrato: 0 Empresa: 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Processo Medição 00628/3096/2024

Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO  
 Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Data da Assinatura: 28/05/2024  
 Valor Contrato: 18.786.000,00  
 Valor dos Aditivos: 0,00  
 Valor Total Contrato: 18.786.000,00  
 Prazo: 549 Dias  
 Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO									
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			TOTAL EM R\$		TOTAL ACUM. EM R\$	
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado				
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	0,00	111.643,57	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	51.593,39	51.593,39	658.274,71	51.593,39	658.274,71	3.622.125,37
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	37.143,74	88.737,13	473.913,11	88.737,13	473.913,11	4.096.038,48
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	60.560,23	149.297,36	772.681,70	149.297,36	772.681,70	4.868.720,18
10 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	30.543,65	179.841,01	389.703,35	179.841,01	389.703,35	5.258.423,53
11 a	01/08/2025 a 30/08/2025	692.582,46	3,68 %	5.771.164,98	30,72 %	58.898,59	238.739,60	751.481,05	238.739,60	751.481,05	6.009.904,58
12 a	01/09/2025 a 30/09/2025	1.496.399,98	7,96 %	7.267.564,96	38,68 %	127.256,84	365.996,44	1.623.656,82	365.996,44	1.623.656,82	7.633.561,40
13 a	01/10/2025 a 31/10/2025	1.581.953,81	8,42 %	8.849.518,77	47,10 %	134.532,51	500.528,95	1.716.486,32	500.528,95	1.716.486,32	9.350.047,72

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Faturamento ANDRE LUIZ COST 12/11/2025 Página : 1

Eng Fiscal Ageto/sop/dfmop Engº Civil Camylla Ferreira César Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas  
 Engº Civil Fernando de Silva O. Glória Engº Civil Camillo F. Collino Jr Superintendente de Obras Públicas



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 13/11/2025 10:55:02

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 13/11/2025 09:42:31

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PAGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9A5774E802328C1E | SGD:2025/38869/061117





### REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/061117** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	13/11/2025 10:55:02 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	13/11/2025 09:42:31 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	12/11/2025 11:48:57 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	12/11/2025 11:16:05 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AGETO

Fis 1391

130

# FOTOGRAFICO RELATÓRIO

1º JAN 1989  
ESTADO DO TOCANTINS

**CONTRATO:00022/2024**

**OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO**

**VISITA : 05/11/2025 REFERENTE À 13ª MEDIÇÃO**

**LOCAL : PALMAS**

**EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**



de Tec


ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 13/11/2025 09:45:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: C1BD877F0232E60F | SGD:2025/38969/061117





**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

AGETO  
Fls 1332  
136

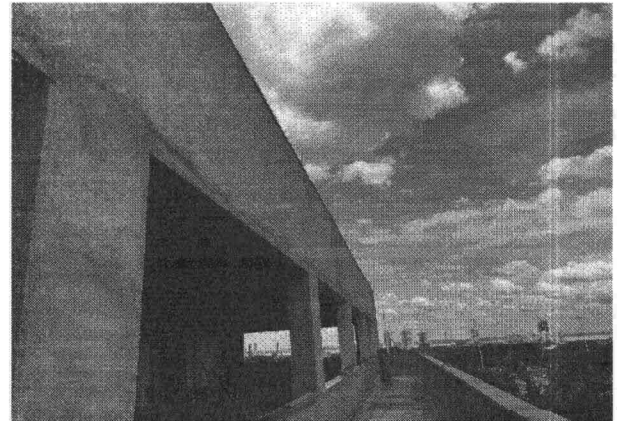

=> **TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS**

=> **CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO**

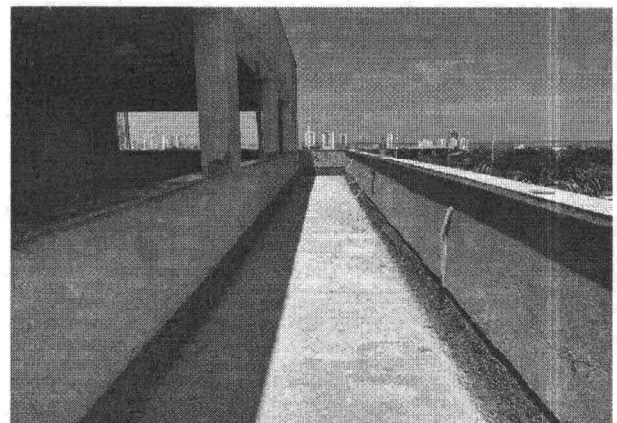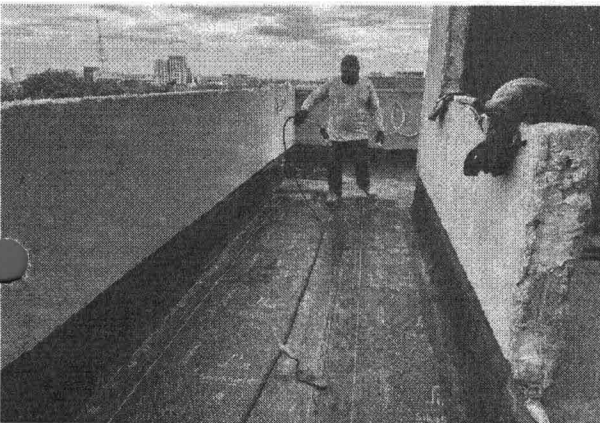

=> **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO**



=> **PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA**



de Tec



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 13/11/2025 09:45:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: C1BD877F0232E60F | SGD:2025/38969/061117

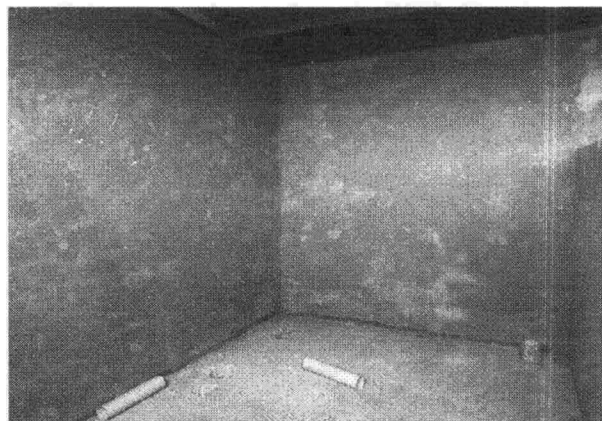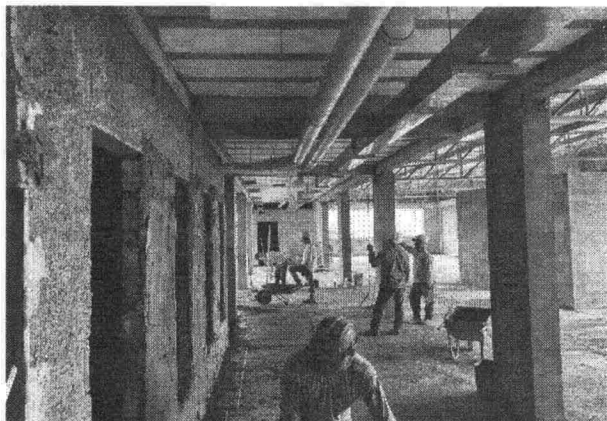

=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L


=> EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

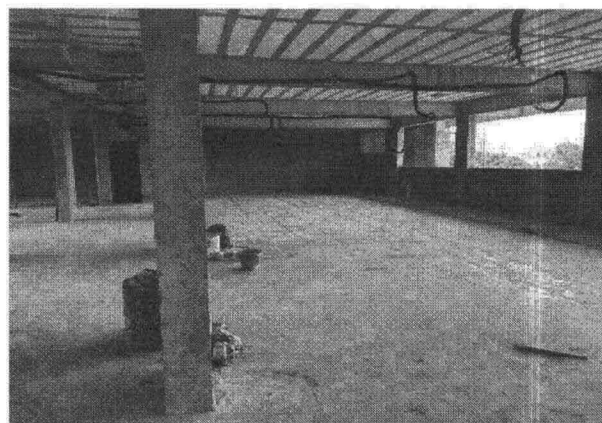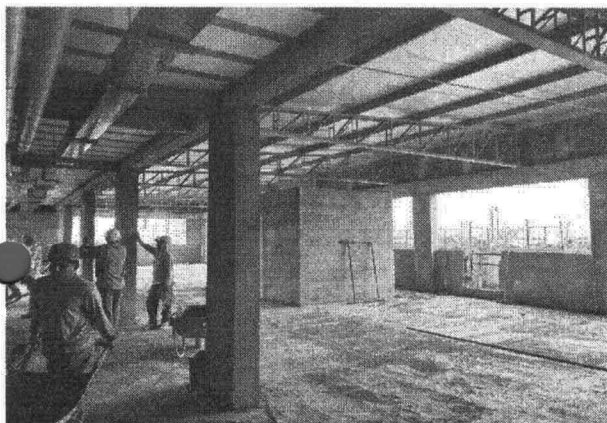

=> CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE



=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS



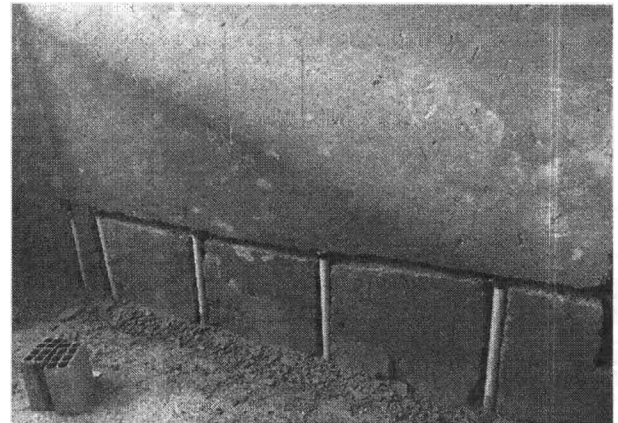

=> EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL



=> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

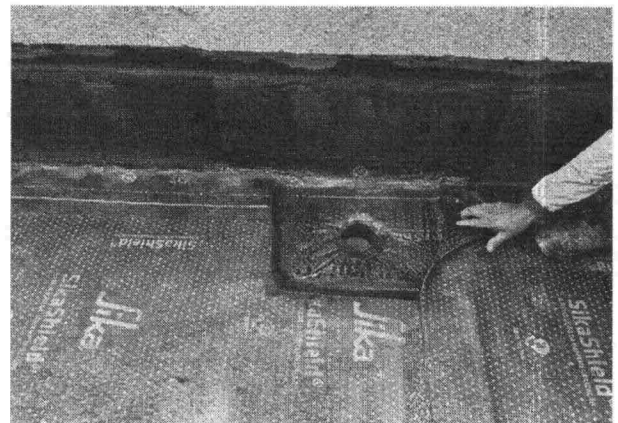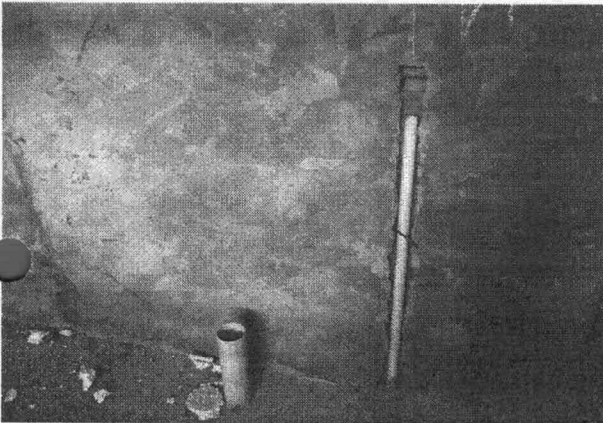

=> INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



=> INSTALAÇÕES DE DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS



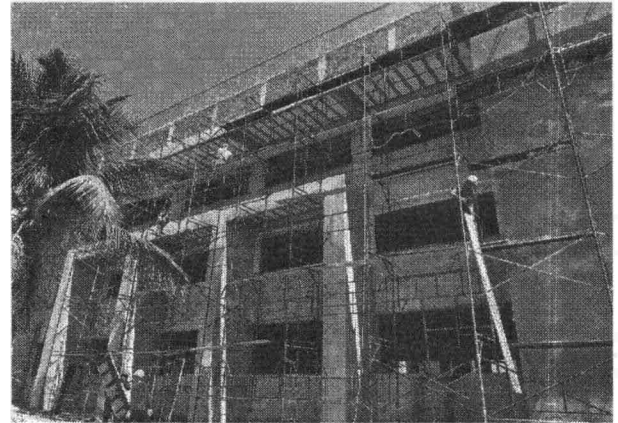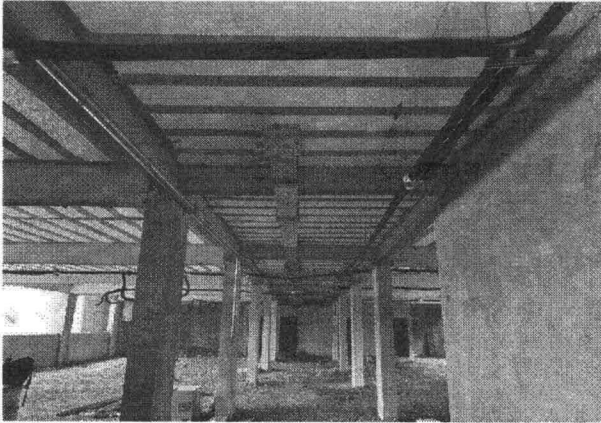

=> INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC


=> REVESTIMENTO EXTERNO

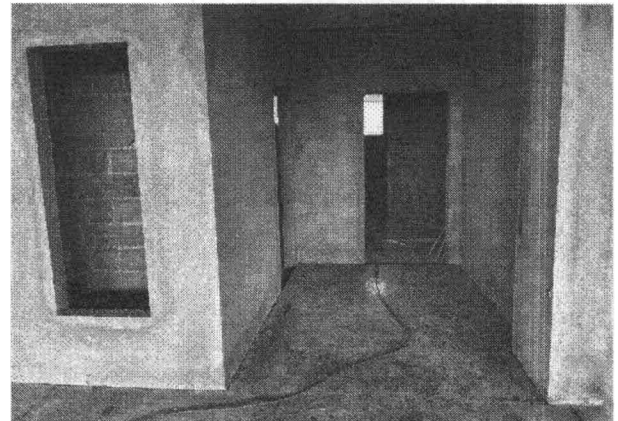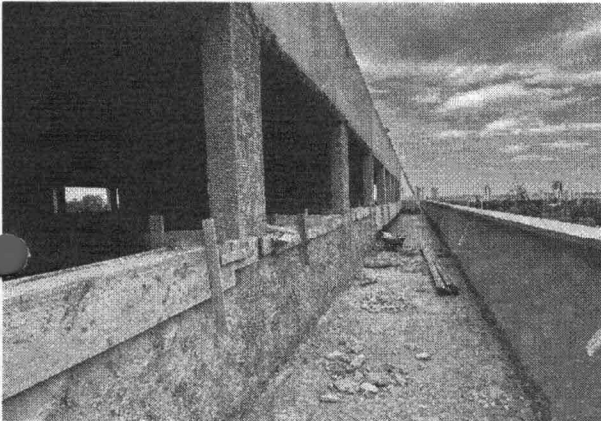

=> REVESTIMENTO EXTERNO



=> REVESTIMENTO INTERNO



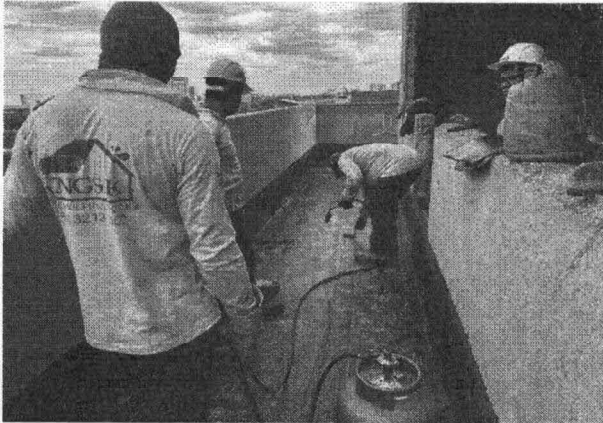

=> IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA



=> SISTEMA HIDRÁULICO

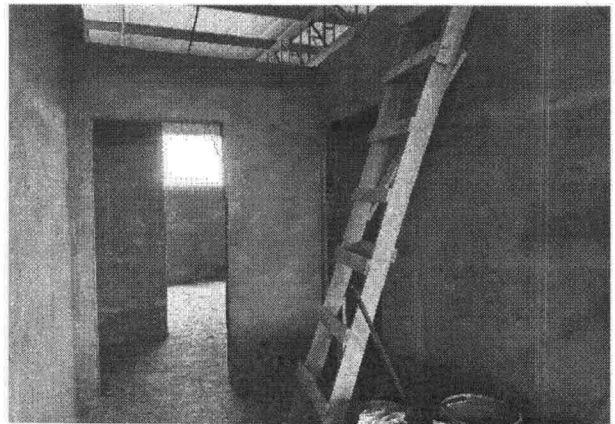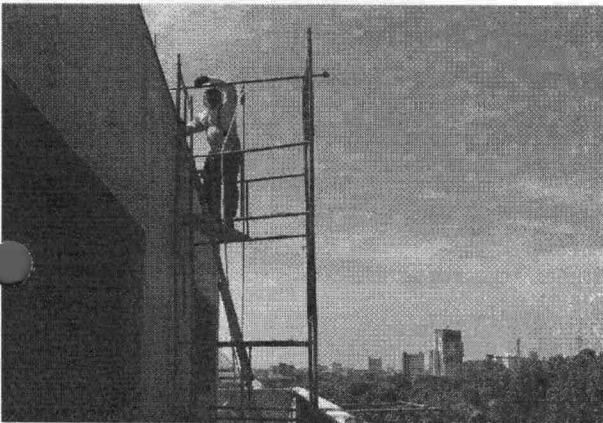

=> REVESTIMENTOS EXTERNOS


=> REVESTIMENTOS INTERNOS



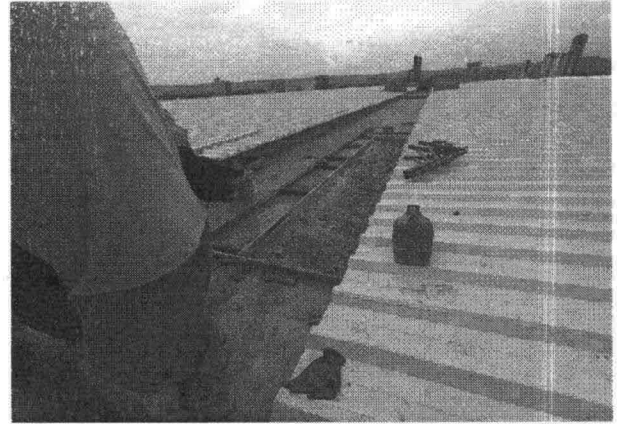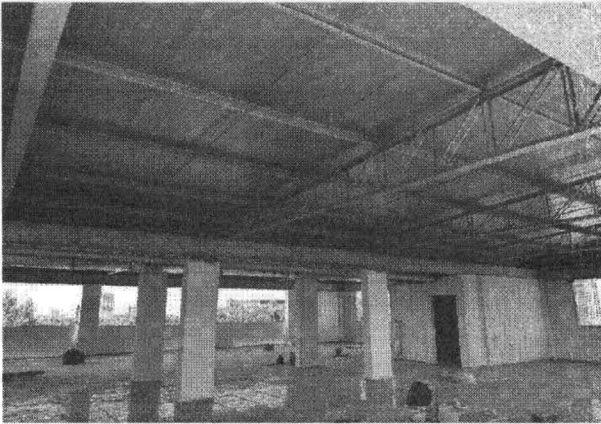

⇒ COBERTURA

⇒ COBERTURA

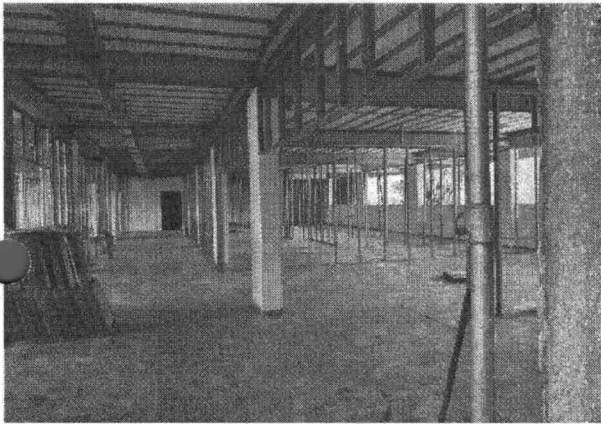

⇒ REVESTIMENTO DE PISO INTERNO


⇒ SISTEMA DE AR CONDICIONADO



de Tec


ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 13/11/2025 09:45:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: C1BD877F0232E80F | SGD:2025/38969/061117

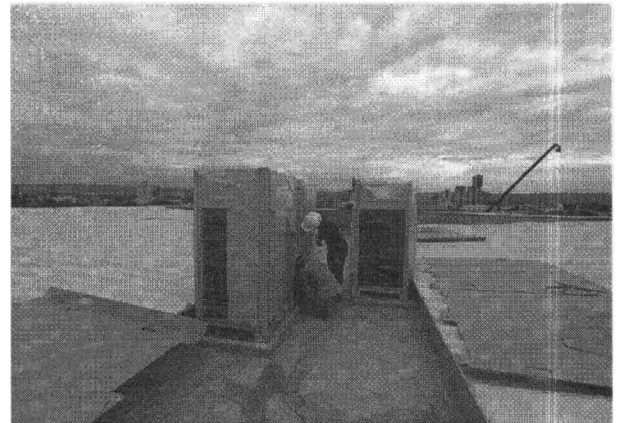

=> SISTEMA DE AR CONDICIONADO

=> SISTEMA DE AR CONDICIONADO

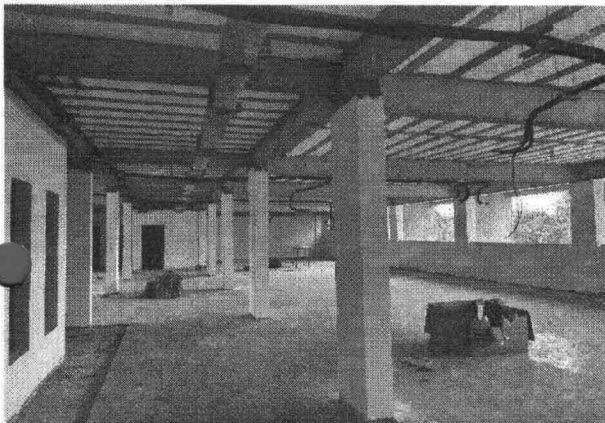

=> EMASSAMENTO INTERNO

=> SISTEMA SANITÁRIO



de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 13/11/2025 09:45:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: C1BD877F0232E60F | SGD-2025/38969/061117



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

AGETO  
Fls. 1389  
Bls



=> SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

=> COBERTURA





Governo do Estado do Tocantins  
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura  
**ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)**

AGETO

Fis 1340

Blw

Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOURO-COTA / 00 / 00

Empresa : CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Data assinatura: 28/05/2024

Data-Base : 04/2024

Processo: 01320/3896/2023

Processo Medição: 00628/3096/2024

Data Licitação: 05/04/2024

Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL

Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

**VALORES**

Valor Contrato a PI	: 18.786.000,00	
Aditivos	: 0,00	
Valor Total a PI	: 18.786.000,00	
Valor Medido a PI	: 8.849.518,77	47,11%
Valor Medido Reajustamento	: 500.528,95	
Valor Total Faturado	: 9.350.047,72	
Saldo do Contrato	: 9.936.481,23	52,89%
Última Medição	: 13ª - Parcial	
Período da Última Medição	: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Situação	: Em Andamento	

**PRAZO / ADITIVOS**

Data da Ordem de Serviço	: 24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	: 28/05/2024
Prazo Execução Contratual	: 549	Prazo de Vigência	: 731
Venc. do Prazo de Execução	: 24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	: 28/05/2026



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 12/11/2025 11:16:06

de Tec. Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: D7BEBDF502329C20 | SGD:2025/38969/061117



# MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



Nota: 2025000

00000044

Código Verificação  
K2CZ-2ZCU

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

19/11/2025 09:19:18

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

11/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

### SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 474.586,14

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 1.107.367,67

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 1.581.953,81

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Destinados à Pagamento da 13ª medição da construção do prédio Anexo da Aletto

Em 25/11/25

Antônio Lopes Braga Junior  
Diretor de Área Administrativa

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	18.983,45	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.581.953,81	474.586,14	0,00	1.107.367,67	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	55.368,38	0,00	1.507.601,98	1.581.953,81

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 212.772,79 Federal e R\$ 79.097,69 Municipal. Fonte: IBPT [5FF712]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17210001204490079000137250000000004425110324237589

Visualizado em: 19/11/2025 09:19:19

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

**Contrato nº 22/2024**

PROCESSO: 2024/38960/000628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE  
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

**ATESTO**

ATESTO à nota fiscal nº 044/2025, no valor de R\$ 1.581.953,81 (Um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). Referente à 13ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 19 de novembro de 2025.

*Assinado Digitalmente*  
**André Luiz Costa Lima**  
Matrícula: 11684976-4  
Fiscal de Obra.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7104  
E-mail: gabpres@ageto.to.gov.br

